

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET SECURITE ALIMENTAIRE

PROGRAMME D'APPUI AU DEVELOPEMENT
RURAL INCLUSIF ET RESILIENT



FIDA
Investir dans les
populations rurales

Unité Nationale de Coordination du
Programme (UNCP)

Le Coordonnateur



Pays : République Démocratique du Congo

Financement du FIDA : Prêt No. 2000003242

Financement du FIDA : Don No. 2000003241

Financement de l'OFID : N°15153P



Février 2025



TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
ACRONYMES	3
INTRODUCTION	8
1 NIVEAU D'EXECUTION FINANCIERE	11
2 ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2024.	14
Le taux d'exécution physique des activités à la fin de l'exercice 2024 est de 66% pour les activités totalement achevées et 11% pour les activités en cours d'achèvement et 23% des activités qui n'ont pas été entamées.	14
a) Accès aux semences R1/R2	15
b) Accès aux semences de base	17
c) Accès aux alevins	18
1.2. DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES CLIMATIQUEMENT RESILIENTES	27
2.2.1. Infrastructures de marché	32
2.3.1. Appui à l'hydraulique rural	32
3 NIVEAU D'EXECUTION FINANCIERE	Erreur ! Signet non défini.
4 NIVEAU D'EXECUTION FINANCIERE	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXES	39
Champ de Niébé dans la zone Kasai	47
Etang piscicole dans la Province de Maniema	48

ACRONYMES

ACE	Agence Congolaise de l'Environnement
AMO	Assistant au Maître d'Ouvrage
AMI	Appel à Manifestation d'Intérêt
AO	Appel d'Offres
AOI	Appel d'Offres International
ANO	Avis de Non Objection
AVENIR	Autonomisation par la Valorisation de l'Entrepreneuriat agricole et résilient sensible à la Nutrition, Inclusif et Résilient.
BADEA	Banque Arabe pour le Développement Économique de l'Afrique
CEP	Champs École paysans
CN	Coordonnateur National
COFIL	Comité de Pilotage
CP	Coordonnateur Provincial
CPM	Conseiller en Passation des Marchés
CPSE	Conseiller en Programmation, Suivi, Evaluation
CSPP	Cellule de Suivi des Programmes et Projets
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
DAI	Direction Agro-Industrie
DANTIC	Direction Archives et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication
DATAME	Direction Aménagement des Terres Agricoles et Maîtrise de l'Eau
DCP	Document de Conception du Projet
DNO	Demande de Non Objection
FAO	Fonds des Nations Unies pour l'Agriculture
FEC	Fédération des Entreprises du Congo
FIDA	Fonds International de Développement Agricole
FONER	Fonds National d'Entretien Routier
INERA	Institut National de Recherche et d'études Agronomiques.
MINAGRI	Ministère de l'Agriculture
MOD	Maîtrise d'Ouvrage Délégué

MSP	Ministère de la santé publique
OFID	OPEC Fund for International Development
OHNR	Office National d'Hydraulique Rurale
ONG	Organisation Non Gouvernementale
ONGD	Organisation Non-Gouvernementale de Développement
OP	Organisation Paysanne
OPF	Organisation Paysanne Faïtière.
OR	Office des Routes
OVDA	Office des Voies de Desserte Agricole
PADRIR	Programme d'Appui au Développement Rural Inclusif et Résilient
PAPAKIN	Projet d'Appui aux Pôles d'Approvisionnement de Kinshasa en produits vivriers et maraîchers
PASA-NK	Projet d'Appui au Secteur Agricole du Nord-Kivu
PIRAM	Programme Intégré pour la Relance de l'Agriculture dans le Maniema
PPM	Plan de Passation des Marchés
PRONANUT	Programme National de Nutrition
PTBA	Programme de Travail et Budget Annuel
RDC	République Démocratique du Congo
SDCV	Spécialiste Développement Agricole et Chaînes de Valeur
RIR	Responsable des Infrastructures Rurales
RPM	Responsable Passation des Marchés
RSE	Responsable Suivi-Evaluation
SENAQUA	Service National d'Aquaculture
SENASEM	Service National de Semence
SISE	Système Informatisé de Suivi Evaluation
SNVA	Service National de Vulgarisation Agricole
Tdrs	Termes de Référence
TVA	Taxe sur la Valeur Ajoutée
UCP	Unité de Coordination du Programme
UNCP	Unité Nationale de Coordination du Programme
USD	Dollars des Etats-Unis d'Amérique

FICHE SYNOPTIQUE DU PROGRAMME

Pays	REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Nom du Projet	Programme d'Appui au Développement Rural Inclusif et Résilient
Siège et Adresse	Secrétariat Général à l'agriculture, Avenue Attela, croisement Boulevard du 30 Juin et Avenue Attela, Commune de la Gombe / Kinshasa.
Coût total du projet	130,459 Millions de dollars US.
	Contribution du FIDA de 36,491 millions \$ EU (28,0 % du total) dont 73% sous forme de prêt et 27% sous forme de don.
	Prêt de la BADEA de 50,739 millions \$ EU (38,9%).
	Prêt de l'OFID à hauteur de 25,194 millions \$ EU (19,3%).
	Contribution des bénéficiaires de 3,341 millions \$ EU (2,6%) sous forme d'apport en nature dans les travaux et activités.
	Apport du Gouvernement de 14,694 millions \$ EU (11,2%) sous forme d'apports en nature (bureaux) et d'exemptions de divers droits et taxes.
Structure de tutelle	Ministère de l'Agriculture, RDC
Structure de mise en œuvre	Unité Nationale de Coordination et de Gestion
Contact	Damien-Joseph MUTEBA KALALA +(243)814774239 uncp@padrir.org
Objectif Global	Contribuer à l'amélioration durable des conditions d'existence des ruraux et à la réduction de la pauvreté en milieu rural
Objectifs du projet	Contribuer à la réduction de la pauvreté rurale et à l'amélioration de la sécurité alimentaires et nutritionnelles et de la résilience climatique
Composantes	<ul style="list-style-type: none"> - Appui à la production, commercialisation et structuration des filières résilientes au changement climatique - Infrastructures de desserte Développement des infrastructures rurales climato-résilientes - Coordination, Gestion, Suivi-évaluation et capitalisation des

	connaissances.
Zones d'intervention	Le Programme est mis en œuvre dans quatre provinces <i>de la RDC</i> : le <i>Maniema (7 Territoires dont 4 Territoires de consolidation des actions du PIRAM)</i> , le <i>Kasaï Central (3 Territoires)</i> , le <i>Kasaï Oriental (3 Territoires)</i> et la <i>Lomami (3 Territoires)</i> qui sont des nouvelles zones d'extension.

ZONE D'INTERVENTION DU PADRIR



Les appellations figurant sur cette carte et sa représentation graphique ne constituent en aucun cas une prise de position du FIDA quant au tracé des frontières ou limites, ou aux autorités de tutelle des territoires considérés.

Source: FIDA | 23-08-2019

INTRODUCTION

La République Démocratique du Congo (RDC) est un des plus grands pays d'Afrique subsaharienne avec une superficie de plus de 2 millions de Km² pour près de 90 millions d'habitants. La RDC est dotée des ressources naturelles exceptionnelles, notamment des minéraux tels que le cobalt et le cuivre, un potentiel hydroélectrique, des terres arables importantes, une biodiversité immense et la deuxième plus grande forêt tropicale du monde.

Cependant, malgré toutes ces richesses naturelles, la RDC figure parmi les cinq nations les plus pauvres du monde. Selon la Banque Mondiale, en 2024, environ 73,5 % des Congolais vivent avec moins de 2,15 dollars par jour. Environ une personne sur six qui vit dans une extrême pauvreté en Afrique subsaharienne habite en RDC¹.

La RDC reste parmi les pays les plus touchés par la malnutrition sous plusieurs formes et particulièrement la forme chronique bien que le taux de prévalence de cette forme de malnutrition ayant baissé de 43% en 2010 à 41,8% en 2018 selon les résultats des enquêtes MICS.

Le Programme National de Nutrition estime néanmoins à plus de 9 millions les enfants qui souffrent de malnutrition en RD Congo.

C'est dans ce cadre que le Gouvernement à lancé un nouveau Plan Stratégique Multi-sectoriel de Nutrition 2023-2030 qui vise **à améliorer l'état nutritionnel de la population de la RDC, en particulier les enfants de moins de cinq (05) ans, les adolescents, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes du troisième âge, les personnes handicapées et tout autre groupe vulnérable par la synergie des interventions multi sectorielles de nutrition.**

Dans la même optique, le Ministère d'Etat de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire a lancé la campagne Agricole 2024-2025 avec comme slogan «Rentrons à la Terre» pour inviter les populations congolaises à faire de la revanche du sol sur le sous sol une réalité.

La situation politique au pays est stable notamment après la réélection du Président de la République et la mise en place des institutions légales.

Pendant ce temps, la situation sécuritaire a été une fois encore marquée par la persistance des conflits armés dans la Province du Nord Kivu et dans l'ITURI. Des pistes de solutions politiques et diplomatiques sont explorées pour ramener la paix sur l'ensemble du Territoire National.

Dans la zone du projet, le Territoire de Kabambare est toujours difficile d'accès à cause de la présence des milices armées.

La conjoncture économique intérieure a été caractérisée par la poursuite de la stabilité sur les principaux marchés. Le taux de change fluctue dans une base de stabilité depuis le mois de mai et l'inflation en glissement annuel poursuit son recul.

Le Fonds Monétaire International (FMI) a salué le dynamisme de l'économie congolaise qui s'est traduit par un taux de croissance du PIB réel estimé à 6,0 % alors que les projections annuelles du taux de croissance étaient de 4.7%².

Cependant, cette performance économique ne se traduit pas forcément en bien-être communautaire.

Dans la zone du projet, la dégradation prononcée des infrastructures de base dont les routes nationales et les pistes rurales constitue une contrainte pour une couverture totale de la zone du projet. C'est le cas pour les Territoires de Lubutu et Punia dans la Province de Maniema ; Lwiza dans le Kasai Central, Kabinda et Lubao dans la Province de Lomami.

Sur le plan interne, toute l'équipe du projet s'est mobilisée pour répondre favorablement aux attentes des parties prenantes et sortir le projet de la zone de controverse.

S'agissant de la gestion du personnel, deux agents ont quitté le projet à savoir la Coordinatrice Provinciale de Maniema et la Conseillère Genre et Inclusion Sociale. Le Conseiller en Passation de Marchés quant à lui est décédé de suite d'une longue maladie.

² Zoom Eco, 16 janvier 2025

Le processus de recrutement du personnel manquant (Conseillère Genre, Conseiller en Passation de Marchés, Comptable de l'UCP Kindu et Assistant comptable UCP Kasai) est toujours en cours.

Concernant la réorganisation des services, à la suite de la décision de la mission de supervision conjointe FIDA-Gouvernement du mois de novembre 2023, le siège de l'UNCP a été délocalisé de Kinshasa à Kananga pour rapprocher davantage la Coordination nationale des bénéficiaires du projet.

Concernant le co financement, l'OPEC Fund a libéré les fonds dont une partie est versée dans les comptes du projet. Ces fonds sont utilisés dans les quatre Provinces pour la concrétisation des infrastructures de base mais insuffisant pour atteindre les cibles initiales.

Par contre, le manque des fonds BADEA (40% du financement du projet) constitue à ce jour une préoccupation majeure dont la persistance aura un impact négatif sur l'atteinte des objectifs du projet.

Les contacts sont en cours à tous les niveaux, FIDA, Comité de pilotage et CSPP, pour

Dans son rôle d'autorité de référence du projet, le comité de pilotage a organisé un atelier stratégique pendant 5 jours qui a débouché sur les grandes orientations.

Le projet reçu une mission de supervision conjointe FIDA-Gouvernement au mois de juin 2024. Cette mission a permis de constater une amélioration sensible de la qualité de gestion du projet. Cependant, l'accroissement du taux d'exécution financière reste un défi existentiel pour le projet.

1 NIVEAU D'EXECUTION FINANCIERE

1.1 Taux d'exécution fiduciaire du programme

Sur l'ensemble des financements, la situation se présente comme suit :

Décaissement fond FIDA à fin décembre 2024	
DATE DE CLOTURE	Sept-28
MONTANT TOTAL (En million de USD)	36 500 000,00
DECAISSEMENTS CUMULES (En million de USD)	13 570 111,89
MONTANT NON DECAISSE (En million de USD)	22 929 888,11
CUMUL POURCENTAGE DECAISSE (en %)	37,18
MONTANT DECAISSE (de janvier à déc 2024)	9 039 018,49

Commentaires:

Sur **36 500 000 \$** comme total des fonds FIDA, le montant décaissé jusque-là est de **13 570 1120 \$** soit 37.18%.

Le faible taux de revu à posteriori fixé à **5 000 \$** ne permet de décaisser assez rapidement sans demander l'avis de non objection du FIDA.

Notre souhait est que ce seuil soit revu à la hausse comme c'est le cas dans d'autres projets du portefeuille FIDA en RDC.

Pour l'exercice 2025, le projet a déjà utilisé **3 713 166 USD** sur **9 593 928 \$** ce qui représente 38.7%

II. DECAISSEMENT FOND OFID à fin décembre 2024	
DATE DE CLOTURE	Oct-28
MONTANT TOTAL (En million de USD)	25 000 000,00
DECAISSEMENTS CUMULES (En million de USD)	1 000 000,00
MONTANT NON DECAISSE (En million de USD)	24 000 000,00
CUMUL POURCENTAGE DECAISSE (en %)	4

MONTANT DECAISSE (de janvier à décembre 2024)	1 000 000,000
---	---------------

Commentaires:

Pour ce qui est des fonds OPEC, sur 25 000 000 \$, seulement 1 000 000 \$ décaissé.

Actuellement, le décaissement des fonds OPEC est faible car les procédures sont en cours. Les plus gros décaissements interviendront lors du paiement des cabinets d'étude et des entreprises de construction de l'épine dorsale, pistes rurales, marchés et infrastructures connexes.

Initialement, les fonds OPEC étaient destinés à la réhabilitation des infrastructures dans la Province de Maniema tandis que BADEA devrait couvrir l'espace Kasai.

En l'absence des fonds BADEA, l'OPEC a donné son aval depuis le mois d'août dernier pour que les fonds mis à la disposition du projet pour la construction/réhabilitation des infrastructures dans les quatre Provinces soient utilisés indistinctement dans toutes Provinces de la zone du projet.

1.2 Etat des marchés

PPM REVISE EXERCICE 2024

Au Courant de l'exercice 2024, le Plan de Passation des Marchés (PPM) pour les Coordinations du PADRIR avait prévu au total 121 marchés pour un montant total **6 453 709 \$** pour l'ensemble dont :

- Les marchés des biens (22) : **1 046 573\$**; dont 19 marchés attribués, 2 marchés en cours et 1 marché dont le processus non déclenché.
- Les marchés des travaux (5) : **265 000 \$** tous déjà passés.
- Les marchés des services de conseil (94) : **5 142 709 \$** dont 49 marchés attribués, 25 marchés en cours et 20 marchés dont le processus non déclenché.

Tableau : Marchés des biens

Libellés	Nombre	Montant (USD)	Pourcentage
----------	--------	---------------	-------------

Marchés Biens			
Marchés prévus	22	1 046 573	100%
Marchés déjà passés	19	914 573	87
Marchés dont le processus a été déjà déclenché	2	114 000	11
Marchés dont le processus n'a pas encore commencé	1	18 000	2

Le taux d'exécution des marchés des biens est de 87%

Tableau : Marchés des travaux

Libellés	Nombre	Montant (USD)	Pourcentage
Marchés Travaux			
Marchés prévus	5	265 000	100%
Marchés déjà passés	5	265 000	100
Marchés dont le processus a été déjà déclenché	0	0	0
Marchés dont le processus n'a pas encore commencé	0	0	0

Le taux d'exécution des marchés des travaux est de 100%

Tableau : Marchés des services

Libellés	Nombre	Montant (USD)	Pourcentage
Marchés des Services			
Marchés prévus	94	5 142 136	100%

Marchés déjà passés	49	2 914 575	57
Marchés dont le processus a été déjà déclenché	25	1 409 561	27
Marchés dont le processus n'a pas encore commencé	20	818 000	16

Le taux d'exécution des marchés des services est de 57% à cause notamment de quelques protocoles avec les services techniques de l'Etat qui n'ont pas été signés.

2 ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2024.

Le taux d'exécution physique des activités à la fin de l'exercice 2024 est de 66% pour les activités totalement achevées et 11% pour les activités en cours d'achèvement et 23% des activités qui n'ont pas été entamées.

Les activités les plus avancées sont celles de la composante 3 avec 78% du taux d'achèvement, suivi de la composante 1 avec 71% du taux d'achèvement et enfin la composante 2 avec 30% du taux d'achèvement.

La situation de la composante infrastructure est justifiée par la mise à disposition des fonds OPEC au mois de mai et l'aval pour son utilisation dans la zone Kasai au mois d'aout 2024.

Actuellement, les activités de la composante 2 se consistent au recrutement des prestataires pour la conduite des études techniques et d'Impact Environnemental et Social.

Les résultats phares enregistrées au cours de cette année :

- **10 325 ménages** agricoles ont bénéficié des semences des cultures vivrières sur **18 620 ménages** attendus à mi-parcours du projet (55.45%)
- **1239 ménages** des maraîchers appuyés avec des semences, matériels et produits phytosanitaires.
- Construction d'une serre à l'INERA Ngandajika pour améliorer les conditions de production à l'abri des intempéries.
- Réhabilitation des étangs piscicoles à Ngandajika, Mudiba et dans la Province de Maniema. Appuis des pisciculteurs de Maniema avec 40 000 alevins.
- Mise en place de plus de 50 champs de démonstration des bonnes pratiques culturales de maïs, niébé et riz.
- Construction et équipement du laboratoire du Service National de Semences à Kindu (Maniema).
- 16 Opérateurs d'Accompagnement de Proximité (OAP) identifiés.
- Délocalisation de la Coordination Nationale de Kinshasa à Kananga (Kasaï Central).
- Réalisation des études sociales dont l'enquête nutritionnelle, l'étude de référence, l'étude des chaînes de valeur et caractérisation des marchés.

Dans les lignes suivantes, la présentation détaillées de l'évolution des activité par composante.

1.1. PRODUCTION AGRICOLE, TRANSFORMATION ET COMMERCIALISATION.

1.1.1. Intensification de la production et promotion des systèmes de cultures résilientes au changement climatique.

2.1.1.1 Production, multiplication et fourniture des semences (Base et commercial y compris alevins ou géniteurs), fertilisants, pesticides et conseil agricole.

a) Accès aux semences R1/R2

Au cours de cette année, **10 325 ménages** agricoles ont bénéficié des semences des cultures vivrières dont **6 475** dans la zone Kasai et **3 850** dans la Province de Maniema.

Tableau 2 : Répartition des semences R1 distribuées par spéculation et par Province.

SPECULATIONS						
PROVINCE	RIZ (Kg)	MAIS (Kg)	NIEBE (Kg)	SOJA (Kg)	MANIOC (MI)	ARACHIDE (Kg)
MANIEMA	53550	5500	0	0	0	8240
LOMAMI	450	21040	7000	600	112500	0
KASAI ORIENTAL	100	13800	6300	300	30000	0
KASAI CENTRAL	550	20800	5600	2650	30000	0
TOTAL	54650	61140	18900	3550	172500	8240

Au total, le projet a distribué 54 650 Kgs de semence de riz (1093 ha), 61 140Kgs de maïs (2038 ha), 18 900 Kgs de niébé (756 ha), 3 550 Kgs de soja (142 ha), 8240 Kgs d'arachide (70 ha) et 172 500 MI de boutures de manioc.

Depuis le début du projet, **15 948 ménages** ont bénéficié des semences améliorées des cultures vivrières et maraîchères **sur 53 200** cibles fin projet soit un taux de réalisation de **± 28.83%**.



Champs de multiplication de riz, ADIAD, Maniema.



Champ de multiplication de niébé/Kasai Oriental Maniema.

Le projet prévoit d'appuyer **15 960** ménages en 2025, ce qui devrait porter le total des ménages appuyés en semences à mi-parcours à **31 908** ménages (sur **18 620** ménages attendus) soit **171%**.

b) Accès aux semences de base

Sur les 74 agris multiplicateurs qui collaborent avec le projet (39 dans la Province de Maniema et 35 dans l'espace Kasai), Trente-cinq (35) agris multiplicateurs ont reçu les matériels agricoles (houes, machettes, haches, etc.) pour accroître leur production.

Les statistiques des semences de base achetées dans les différentes stations de l'INERA se présentent comme suit par spéculation.

Les semences achetées se présente comme suit :

Tableau n° Achat et Distribution semences de base par zone.

Province	Quantité/Spéculation (KGS)						
	Mais	Riz	Niébé	Arachide	Manioc (MI)	Soja	Niébé
Maniema	1250	5620	0	3000	25000	480	300
Kasai Oriental	3125	0	1455	0	107500	3125	0
Kasai Central	3200	0	1425	0	110000	3200	0
Lomami	3150	0	1475	0	107500	3150	0
Total	10725	5620	4355	3000	350000	9955	300

Commentaires :

La Coordination Provinciale de Mbuji mayi a acheté la semence de base l'INERA auprès de l'INERA Ngandajika.

A cause de l'absence de l'offre locale, la Coordination Provinciale de Maniema a acheté la semence de base auprès des stations de l'INERA Gimbi (Kongo Central), Boketa (Sud Ubangi), Nyoka (Ituri).

Le maïs variété samaru et Kasai 1, riz nerica 4, è et giza, arachide G17 et GL24, soja Afya.

En terme d'équipement, dans le but de mettre les cultures à l'abri des intempéries une serre sur les trois planifiées a été réhabilitée à l'INERA Ngandajika.

Des investissements de même nature sont prévues dans le même site pour les serres restantes et d'autres appuis en équipements et construction à l'INERA Salubezya

c) Accès aux alevins

Les stations d'alevinage de Force Agricole de Maniema (FAM) au village Nyoka dans le Territoire de Kailo (21 km de Kindu) et celle du Regroupement des associations Mukulumanya du village Yuma Salokwango à Kalima, Territoire de Pang'i ont été achevées.

Les pisciculteurs de Maniema regroupés au sein de 11 associations (357 membres dont 157 femmes) ont reçu 43 000 alevins (23 000 clarias et 20 000 tilapias).

Les travaux de réhabilitation des étangs piscicoles de la station de Tshioji à ngandajika (Lomami) et du Centre d'Alevinage Secondaire de Mudiba (Lupatapata) ont été réalisés.



Les travaux au CAP Tshioji sont réalisés sur une superficie de 48 ares (48 000 m²) pour 22 étangs et au CAS Mudiba, sur une superficie de 118.74 ares (118 000 m²) pour 12 étangs

Toutes les Coordinations Provinciales du SENADEPA ont signé des protocoles opérationnels avec le projet pour accompagner les pisciculteurs.

A la fin de l'année 2024, 38 associations des pisciculteurs et 52 ménages indépendants sont accompagnés pour un total de 1 970 personnes dont ±40% des femmes.

Les associations des pisciculteurs familiaux sont réparties comme suit par Province :

Dans la zone Kasai, le projet a recensé 23 associations réparties comme suit :

- Kasai Central (Katuishi) : 5 associations pour 75 membres
- Kasai Oriental (Mudiba) : 8 associations pour 80 membres
- Lomami (Tshioji) : 10 associations pour 140 membres.
- Dans la Province de Maniema, il y a 11 associations avec 357 membres dont 157 femmes.
- Le projet a distribué 260 bacs de transport des alevins de 10, 20 et 30 Kgs dont 120 dans la zone Kasai et 140 dans la Province de Maniema.
- La Coordination Provinciale de SENADEPA a aussi acheté 300 alevins carpe commun et 10 000 tilapia à remettre aux associations des pisciculteurs de Maniema.
- Des formations techniques ont été organisées sur la gestion d'un étang, l'insémination artificielle, l'alimentation des poissons.
- Au total, 83 personnes ont été formées par les Experts du SENADEPA (Kinshasa) sur la gestion d'un étang, l'insémination artificielle, l'alimentation des poissons dont 17 femmes et 34 jeunes.
- Une consultante du FIDA a effectué une mission dans le site de Katuishi pour évaluer son potentiel et donc la possibilité de sa réhabilitation.

2.1.1.2 Accès aux équipements et matériels agricoles adaptés

L'ONUDI n'a pas pu soumettre les termes de référence en vue de l'étude d'identification des types d'équipements, des besoins des acteurs et des modalités d'accès. Le marché sera relancé.

1.1.2. Promotion des techniques culturelles raisonnées respectueuses de l'environnement et résilientes au changement climatique

2.1.1.3 Champs de démonstration-adaptation-adoption des bonnes pratiques agronomiques (BPA)

L'activité phare dans le cadre de la promotion des bonnes techniques culturelles est la mise en place des champs de démonstration dans les deux zones et la diffusion dans les ménages pour



Récolte d'arachide dans un champ de démonstration dans le Territoire de Kasongo, Province de Maniema.

mesurer le taux d'adoption.

Sur un total de 240 champs à mettre en place à mi-parcours , il y a actuellement **80 champs fonctionnels (33.3%) d'une superficie moyenne de 0.20 ha de maïs, Riz et Niébé** regroupant 1954 personnes (752 femmes et 815 jeunes).

Il y a 35 champs dans la Province de Maniema et 45 dans l'espace Kasai.

Cette activité a commencé cette année et se poursuivra pendant les deux prochaines années.

2.1.1.4 Aménagements des sites hydro-agro-piscicoles.

Protocole avec le PNR

- En rapport avec les aménagements des sites hydro-agro-piscicoles, un protocole de collaboration avec le Programme National Riz est en cours de finalisation . Par ce protocole, le PADRIR confie au PNR la mission de mener les études techniques et EIES des sites pour les aménagements hydro agricoles et piscicoles dans la Province de Maniema.
- Cette étude a été retardée afin de permettre à la Coalition Foncière Nationale (CFN) de mener l'analyse de la sécurisation foncière des espaces aménageables par le projet dans la Province de Maniema et dans l'espace Kasai.
- Le Protocole sera soumis à l'ANO du FIDA dès que le PTBA 2025 entre en vigueur. Cette étude va déboucher sur l'élaboration des Dossiers d'Appel d'Offre qui serviront au recrutement des entreprises de construction.

Protocole avec le SENAHUP

- Les Coordinations Provinciales de SENAHUP ont accompagné 55 OP maraîchères pour un total de 2458 ménages dont 540 ménages dirigés par les femmes.

- Dans le cadre du renforcement des capacités, 62 personnes dont 15 femmes et 20 jeunes ont été formés sur diverses thématiques en lien avec la production maraîchères : compostage, lutte contre les maladies des plantes et ravageurs, la fertilisation.



- Entre temps, le projet a remis des kits maraîchers à 47 regroupements (20 au MANIEMA et 27 dans la zone Kasai) pour un total de 1 239 ménages (273 dirigés par les femmes) en raison de 600 ménages dans la Province de Maniema et 639 dans la zone Kasai.

1.1.3. Amélioration des activités post-récoltes et mise en marché des produits.

1.1.3.1. Amélioration des techniques de transformation respectueuses de l'environnement et gestion durable des déchets.

- *Analyse des chaînes de valeur et cartographie des marchés (4 Provinces)*
- L'étude sur les chaînes de valeur porteuses et la cartographie des marchés a été réalisée par la Direction Agro-Industrie du SG à l'agriculture. La séance de restitution a eu lieu.

- Le rapport de cette étude ouvre la voie à l'analyse des besoins en transformation des produits agricoles, identification des sites et évaluation des types de matériels de transformation des produits agricoles adaptés aux besoins des producteurs.
Cette étude sera conduite par l'IITA et devra permettre d'évaluer les besoins en équipements de transformation ainsi que les conditions d'accès et d'identifier les sites potentiels d'installation tenant compte de la disponibilité des produits, des opportunités commerciales et économiques ainsi que des capacités managériales des bénéficiaires.
- *Facilitation de l'entrepreneuriat des jeunes, des femmes et des autres groupes vulnérables.*
- Pour ce qui est de la facilitation de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, les experts en entrepreneuriat par l'approche d'incubation de l'ancien projet PEA Jeunes du Cameroun ont sensibilisés les agents du projet et les autres acteurs concernés sur cette approche.
- La feuille de route issue de cette mission est actuellement en cours de mise en œuvre avec trois phases :
 - ✓ Voyage d'échange d'expérience au Cameroun (réalisé),
 - ✓ Etudes préalables et modélisation du dispositif,
 - ✓ Déploiement du dispositif d'incubation et de financement agricole.
- Les consultants -Ex PEA JEUNES) vont signer les contrats au début de l'année 2025.
- Sur le plan nutritionnel, l'enquête nutritionnelle et alimentaire a été menée par le PRONANUT.

Les résultats ont été restitués et validés lors d'une séance publique et le rapport final est disponible.

Résumé du rapport

L'étude a démontré que toutes les zones du projet sont concernées par les problèmes nutritionnels mais avec des niveaux de prévalence différents : 3 Provinces sur 4 ont un niveau de prévalence élevé (Kasaï Oriental avec 17,1% de taux de prévalence, la Lomami avec 12,7%) et cette prévalence est assez faible dans la Province de Maniema avec 10,9%. S'agissant des bassins de production, 7 bassins de production (territoires) sur les 16 ont présenté des prévalences de malnutrition aiguë globales supérieures au seuil d'intervention

de 10%.

Il s'agit des bassins à problèmes nutritionnels préoccupants (Lubao, Ngandjika, Kabinda, Kabeya Kamwanga, Lupatapata, Lubutu, Punia)) et des bassins à problèmes nutritionnels critiques (Katanda et Kibombo).

Par rapport à la malnutrition chronique, les proportions sont encore plus inquiétantes les quatre Provinces avec des prévalences supérieures au seuil de 30% considéré comme seuil critique.

La province de la Lomami est la plus touchée avec 54,4% d'enfants souffrant de malnutrition chronique, dont 18,8% sous la forme sévère. Elle est suivie par le Maniema (52,4%), puis par le Kasai Central (46,2%) et enfin par le Kasai oriental (44,8%).

La proportion des ménages avec une diversité alimentaire faible (ayant consommé moins de 4 des 12 groupes d'aliments) est plus prononcée dans les provinces du Kasai Central (68,2%) et du Kasai Oriental (57,4%) tandis qu'elle est moins prononcée dans les deux autres provinces (48,2% dans le Maniema et 28,1% dans la Lomami).

Plusieurs autres insuffisances ont été constatées sur la santé de l'enfant, de la nutrition et de l'hygiène.

En termes d'action proposées, nous notons :

Renforcer les interventions portant sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant dans les bassins d'interventions en mettant l'accent sur l'alimentation de complément et plus particulièrement la diversité alimentaire.

Communiquer suffisamment en ciblant les aliments non consommés mais riches en protéines (les œufs, les légumineuses, les aliments riches en vitamine A,).

Développer et vulgariser les recettes locales améliorées, notamment celles préparées avec les aliments provenant des cultures vulgarisées par le PADRIR (soja, Niébé, arachide...) o

Promouvoir la consommation de certains aliments produits localement mais souvent non consommés (les légumineuses, les fruits et légumes riches en vit A) o

Promouvoir le petit élevage et le jardinage domestique, l'aquaculture, l'apiculture

Renforcement des capacités des prestataires de soins et des animateurs communautaires la prise en charge nutritionnelle des enfants de moins de 4 ans, des femmes enceintes et des femmes allaitantes.

Assurer l'autonomisation des femmes par les activités génératrices et les caisses d'épargne

A améliorer la qualité de l'eau, de l'hygiène et l'assainissement des milieux. Pour la mise en œuvre de toutes ces recommandations, le projet a signé des protocoles opérationnels avec les quatre Coordinations Provinciales de PRONANUT pour notamment sensibiliser les ménages sur les bonnes pratiques nutritionnelles, alimentaires et hygiéniques tenant compte des thématiques proposées dans le rapport d'enquête nutritionnelle et alimentaire.

Concernant les protocoles opérationnels avec les Coordinations Provinciales du PRONANUT, seule la Coordination de Maniema a signé le protocole opérationnel avec le projet pour la sensibilisation des ménages sur les bonnes pratiques alimentaires et hygiéniques ainsi que sur **l'Allaitement maternel exclusif** comme mode d'alimentation équilibrée, la valorisation des aliments locaux ayant une grande valeur nutritive accompagné de la démonstration culinaire.

Au total, le PRONANUT a 894 personnes dont 267 hommes, 627 femmes et 220 jeunes dans quatre territoires.

1.1.4. Structuration et renforcement des capacités techniques des organisations des producteurs (OP/OPF), des services étatiques et des acteurs privés en amont et en aval de la production agricole.

1.1.4.1 Structuration et renforcement des capacités techniques des organisations des producteurs (OP et OPF)

- Le cabinet Saphir a été recruté pour identifier et sélectionner les Opérateurs d'Accompagnement de Proximité (OAP). A ce titre, 16 OAP ont été identifiés en raison d'une structure par Bassin de Production.
- Les OAP ont été appréciés sur base des critères ci-après : Maturité juridique, Gouvernance interne, Autonomie Administrative et financière, Participation des femmes et des jeunes, Capacités techniques et logistiques, Prestations de services sur le terrain, Partenariat.
- L'analyse des structures visitées a démontré que plusieurs organisations disposent des documents juridiques exigées dont le F92 mais elles sont moins actives sur terrain notamment dans l'accompagnement des producteurs. D'autres faiblesses se résument dans la mauvaise gouvernance interne, la

faible proportion des femmes et des jeunes dans les instances décisionnelles, très peu de personnel qualifié, faible autonomie financière, etc.

- Un plan de renforcement des capacités a été proposé pour relever le niveau des structures retenues comme Opérateurs d'Accompagnement de Proximité.
- Actuellement, les contrats avec les 16 OAP sont en cours de préparation pour signature au début de l'année 2025
- Les premières activités avec les OAP sont prévues au début de l'année 2025 avec l'atelier de lancement, la planification des activités 2025 et l'identification/sélection des OP de base et la création des bases de données des bénéficiaires.
- Au total, le projet compte accompagner d'ici la fin de son mandat 800 Organisations Paysannes de base en raison de 50 OP par bassin de production.
- Cette cible sera atteinte grâce à l'implication des OAP qui sont des acteurs de terrain dans les Provinces et les bassins de production.

1.1.4.2. Renforcement des capacités techniques des services étatiques nationaux et provinciaux.

Renforcement des capacités techniques des services étatiques nationaux et provinciaux.


- ✓ Au moins 60% des protocoles opérationnels avec les services impliqués dans la mise en œuvre du projet ont été signés après obtention des ANO.
- ✓ De manière analytique, 11 protocoles sur 12 de la zone Maniema ont été signés soit 91% de taux de réalisation. Le seul protocole non signé est celui avec la Division Provinciale des ITP pour la surveillance des travaux de réhabilitation du bureau de la Coordination Provinciale.
- ✓ Dans la zone Kasaï, 13 protocoles sur 27 ont été mis en œuvre soit 48%. Les retards au niveau de la prise en charge des commentaires du FIDA et de la soumission dans le système sont à la base de cette contre-performance.
- ✓ Au niveau de la Coordination, il s'agissait de signer les protocoles cadres avec les Directions et les Coordinations nationales des services. Cependant, plusieurs protocoles planifiés ont été annulés comme celui avec le SENAFIC et le SENAMA et remplacés par des études préalables.

- ✓ Les travaux de réhabilitation et d'équipement du laboratoire Provincial de SENASEM sont achevés. L'inauguration est prévue au début de l'année 2025.



LABORATOIRE DU SENASEM MANIEMA REHABILITE ET EQUIPE

- ✓ S'agissant du renforcement des capacités, 210 personnes dont 36 femmes et 66 jeunes ont été formées sur des thématiques diverses. Des formations ont été organisées au profit de bénéficiaires des agents de l'Etat pour un total de
- ✓ Les moniteurs agricoles ont été formés sur la lutte contre les maladies et ravageurs des plantes, l'installation des champs de démonstrations, les techniciens de l'INERA Salubezya sur la maintenance variétale de maïs et la production des semences de base, insémination artificielle des clarias avec le ENAHUP, etc.
- ✓ Un diagnostic des STE partenaires du projet a été conduit par l'équipe du projet. A l'issue de cet exercice, un plan d'appui technique et pédagogique a été élaboré et validé.
- ✓ C'est dans ce cadre que des formations ont été organisées en planification et suivi évaluation, des appuis matériels ont été apportés comme les ordinateurs (24 ordinateurs fixes avec imprimantes) et des mobiliers de bureau.

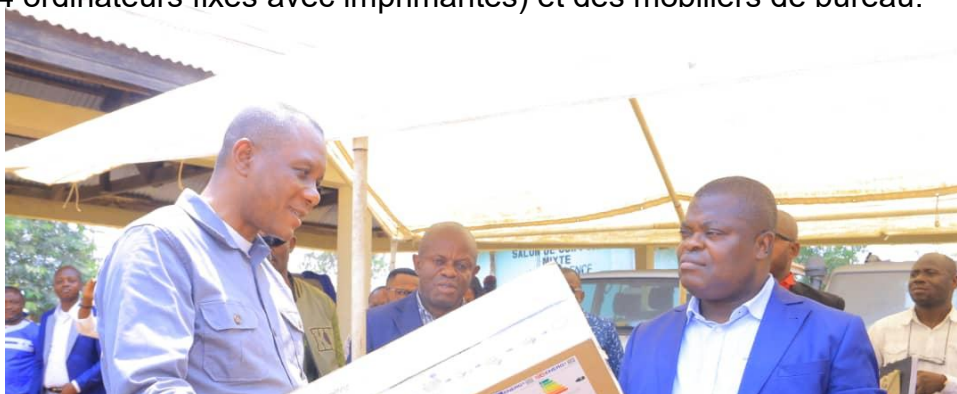

Remise des matériels informatiques au Gouverneur du Maniema

- ✓ Parmi les faiblesses identifiées lors du diagnostic, il y a l'absence d'un cadre de planification, suivi évaluation et reporting des activités, les faibles moyens matériels et des connaissances techniques, utilisation très réduite des Nouvelles Technologies de l'information et de la Communication ce qui accroît la lenteur administrative.
- ✓ Des actions concrètes sont planifiées pour accroître les performances des STE dont les formations et les appuis matériels.

1.2. DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES RURALES CLIMATIQUEMENT RESILIENTES

La Composante 2 du projet met un accent particulier sur le développement d'infrastructures rurales climato-résilientes. Elle ambitionne de faciliter l'accès aux services de base, de stimuler l'activité économique locale et de promouvoir une gestion durable des ressources.

Le coût total des investissements dans la composante infrastructure est de 95 882 000 \$ soit 73% du budget global du projet.

Suivant les apports des bailleurs des fonds, la BADEA intervient à hauteur 38.7%, l'OPEC Fund est à 19.4% et le FIDA avec 5.5%.

Les infrastructures concernées sont :

a) Infrastructures de désenclavement

Épine dorsale Lubutu-Kindu-Kasongo-Kabinda-Mbuji mayi-Kananga): 1300 Km dont 700 Km dans la Province de Maniema (Epine dorsale Lubutu-Kindu-Kasongo) et 600 Dans l'espace Kasai (Kabinda-Mbuji mayi-Kananga).

- b) **Réhabilitation ouvrage d'art sur l'épine dorsale** (Construction de deux bacs de grande capacité)
- c) **Voie de desserte agricole** : 230 Km (140 Km dans la zone Kasai et 90 Km dans la Province de Maniema)
- d) **Marchés et infrastructures connexes** : 16 (4 au Maniema et 12 Kasai)
- e) **Infrastructures sociales** :
 - Forages et sources :80 (20 Maniema et 60 Kasai)
 - Sources d'eau aménagées :150 (30 Maniema et 120 Maniema)
 - Ecoles : 70 (10 Maniema et 60 au Kasai)
 - Centres de santé : 68 (8 Maniema et 60 au Kasai).
 - Centre d'encadrement nutritionnel : 35
 - Micros centrales solaires/autres infrastructures d'énergie renouvelable : 14

Initialement, les fonds OPEC étaient destinés à la réhabilitation des infrastructures dans la Province de Maniema tandis que BADEA couvrait l'espace Kasai.

En l'absence des fonds BADEA, OPEC a donné son aval depuis le mois d'aout dernier pour que les fonds mis à la disposition de PADRIR (25 millions \$) servent également à la construction/réhabilitation des infrastructures dans les trois Provinces de l'espace Kasai.

A ce jour, 1 millions \$ versé dans les comptes du projet.

2.1. Infrastructures de desserte climato-resilientes

2.1.1. Réhabilitation des routes, pistes et des ouvrages d'art prioritaires

2.1.1.1 Réhabilitation de la partie de l'épine dorsale Lubutu-Kindu-Kasongo 700 Km dans la Province de Maniema

- **Contractualiser avec une Assistance à la Maîtrise d'Ouvrage (AMO)**

La première procédure a été déclarée infructueuse du fait d'un seul soumissionnaire sur la liste restreinte.

L'avis à Manifestation d'Intérêt a été relancé. Les soumissions ont été reçues, analysées, et la commission des marchés s'est tenue.

Les Appels à proposition ont été lancés pour les 5 cabinets retenus sur la liste restreinte. Les offres techniques et financières ont été réceptionnées en date du 23 décembre 2024. L'analyse des offres techniques est en cours.

La contractualisation avec l'AMO interviendra au cours du 2^e trimestre de l'année 2025.

- **Recrutement Bureau(x) conseil(s) pour Études techniques et EIES de 700km et ouvrages d'art**

Les analyses financières ainsi que les analyses combinées ont attribué le marché au prestataire Groupement CETRI.

Le contrat est négocié et est soumis à la demande de l'Avis de Non Objection du FIDA.

Le début des travaux est projeté pour le mois de Janvier 2025.

Comme souhaité par les autorités Provinciales, la livraison des études se fera en lots pour permettre le recrutement des entreprises de construction et le début des travaux.

2.1.1.2 Réhabilitation de la partie de l'épine dorsale kabinda-Mbujimayi-Kananga 600 Km dans la zone Kasai

Le processus de recrutement de l'AMO et des bureaux d'études techniques et EIES n'a pas été lancé dans la zone Kasai. Le projet compte capitaliser la liste restreinte issue du recrutement dans la Province de Maniema pour poursuivre dans la partie Kasai dès que BADEA aura libéré les fonds.

Il convient de préciser que pour l'instant, les études techniques et EIES concernent la partie restante de l'épine dorsale soit 112 Km entre les villages Mbanga dans la Province de Lomami et Molowe dans le Maniema.

En effet, deux axes routiers stratégiques, en particulier, ont été identifiés pour bénéficier d'un projet d'asphaltage financé par le gouvernement central. Il s'agit de la RN1 entre

Kananga et Mbuji-Mayi (188 km) et la RN2 reliant Mbuji-Mayi, Kabinda et le village Mbanga (280 km).

Ces deux sections, totalisant 468 km et sont cruciales pour connecter les principales agglomérations de la région et améliorer les échanges commerciaux. Ce développement gouvernemental a cependant poussé le PADRIR à ajuster ses priorités.

Afin de maximiser l'impact des fonds de la BADEA, le projet prévoit désormais d'identifier d'autres routes prioritaires dans la zone du Kasai, représentant elles aussi un total de 468 km. Ces nouvelles routes, associées aux 132 km restants entre le village Mbanga et la frontière entre Lomami et Maniema, garantiront que l'objectif initial de 600 km soit pleinement atteint.

2.1.1.3 Réhabilitation des dessertes agricoles secondaires climato-résilientes

- **Identifier et valider les pistes prioritaires**

- ✓ Trois ateliers Territoriaux ont été organisés pour la sélection des pistes dans les nouveaux territoires de Kimbombo, Lubutu et Punia (Zone Maniema).
- ✓ La session de validation par la CPR des pistes rurales sélectionnées dans les territoires de Kimbombo, Lubutu et Punia (Zone Maniema) a eu lieu

- **Procéder aux Études techniques et EIES de 104.29 km des pistes rurales dans le Maniema (Lot1)**

Zone Maniema

Dans le strict respect des procédures de passation des marchés, le groupement SOTUEC-AGETIP a été retenu pour réaliser les études techniques et EIES des pistes rurales dans la Province de Maniema.

Le déploiement sur le terrain a eu lieu du 31 octobre au 15 décembre 2024, permettant la production d'un premier rapport d'établissement le 15 novembre. Le rapport d'avant-projet sommaire a été transmis au PADRIR le 27 décembre 2024. La livraison des études APD (Avant Projet Détaillé) est prévue pour le 20 janvier 2025, conformément au contrat.

Zone Kasai

Pour le lot 2 (Kasaï-Oriental et Lomami), le cabinet CCU a été retenu et a signé le contrat le 14 octobre 2024, avec un début effectif des prestations le 4 novembre 2024.

Le rapport de premier établissement a été déposé le 28 novembre 2024, et le rapport APS (Avant Projet Sommaire) est attendu durant la semaine du 20 janvier 2025 ;

Pour le lot 3 (Kasaï-Central), le contrat sera signé au début du mois de janvier pour un début effectif des prestations.

2.1.1.4 Recrutement de l'AMO / pistes rurales et les infrastructures sociales

zone Maniema

A l'issue de l'analyse technique et financière des offres reçues, la commission du marché a déclaré la procédure infructueuse pour non conformité budgétaire; car, le soumissionnaire le moins disant soit 1 600 000 \$ contre 500 000 \$ budgétisé dans le PTBA.

Selon les prescrits du COSTAB, les prestations de l'AMO doivent représenter 10% du total du budget des activités.

A présent, l'équipe finalise les termes de référence et l'Avis à Manifestation d'Intérêt pour solliciter l'ANO FIDA pour le Maniema et la zone Kasaï en même temps au début de l'année 2025.

2.1.2. Renforcement des capacités des partenaires étatiques-OVDA Provinciaux

2.1.2.1 Formation des CLERC

La formation des CLER a eu lieu et 20 personnes ont été formées par l'OVDA Maniema.

2.1.2.2. Appui aux RECAM pour la mobilisation des ressources provinciale pour l'entretien des routes-Maniema/Kasaï

RAS

2.1.3. Entretien des routes et ouvrages d'arts réhabilités

Appui aux OVDA Provinciales

Le protocole Opérationnel avec l'OVDA Maniema a été signé depuis le mois de juin 2024.

En exécution dudit protocole, le projet a doté la Direction Provinciale de l'OUDA des meubles et équipements de Bureau au mois d'Aout 2024.

Les autres équipements comme les kits solaires, les petits engins roulants, les GPS sont en cours de livraison. Tous ces matériels seront remis lors d'une cérémonie solennelle qui aura lieu au mois de janvier 2025.

L'acquisition des motos et kits informatiques sera réalisée en 2025.

Dans la zone Kasaï, aucun protocole n'a été signé avec les Directions Provinciales de l'OUDA. Activité à réaliser au premier trimestre de l'année 2025.

2.2. Infrastructures de marchés climato-résilientes et infrastructures d'énergie renouvelable.

2.2.1. Infrastructures de marché.

2.2.1.1. Marchés et infrastructures connexes-Maniema

Les termes de référence de l'activité sont déjà prêts et l'identification des sites des marchés aura lieu au début de l'année 2025.

2.2.1.2. Marchés et infrastructures connexes-Lomami-Kasai

Activité à réaliser au premier trimestre 2025.

2.3. Infrastructures sociales respectueuses de l'environnement

2.3.1. Appui à l'hydraulique rural

2.3.1.1. Forages et sources d'eau Maniema

- L'identification de 30 sites de source d'eau et 20 sites de Forages a eu lieu en partenariat avec l'ONHR (Office National de l'Hydraulique Rurale).
- Un atelier de restitution et validation des sites des sources à aménager et des forages a été organisé avec la participation des bénéficiaires directs et des autorités Provinciales.

2.3.1.2. Mise en place des comités de gestion des infrastructures d'eau potable et formation des animateurs des utilisateurs des infrastructures

- Pour la bonne gouvernance des points d'eau à aménager et des forages, le projet a signé un protocole avec l'IPDR (Inspection Provinciale de Développement Rural) qui va assurer la mise en place des comités de gestion des points d'eau et formé les animateurs.
- Les études socio-économiques préliminaires des points d'eau ont été menées et rapportées.
- Le document du DAO relatif aux sources a été élaboré et en cours de finalisation.

2.3.1.2. Forages et sources d'eau Kasai

Le protocole avec ONHR n'a pas été signé pour l'identification des sites des sources et des forages.

Activité reportée en 2025.2.3.2 Appui à l'accès aux structures sanitaires

2.3.2.1. Réhabilitation des centres de santé, Centres nutritionnels, Écoles (Maniema)

- La mission conjointe PADRIR-DPS-PRONANUT-Education a été organisée dans les territoires de Pangî, Kailo, Kasongo et Kibombo pour cibler les écoles, centre de santé et centres nutritionnels.
- La mission de ciblage sur l'axe Kailo-Nord, Punia et Lubutu a été effectuée par la suite.
- La mission pour le territoire de Kabambare sera effectuée en janvier 2025.
- Le recrutement des consultants individuels devant mener les études techniques a été non concluant pour insuffisance de profil environnementaliste par rapport aux exigences.
- Le recrutement sera relancé cette fois-ci pour recruter les cabinets d'étude.
- A l'issue de cette mission, 36 centres de santé ont été ciblés sur lequel le comité provincial de validation validera 8

2.3.2.2. Réhabilitation des centres de santé, Centres nutritionnels, Écoles (Kasai)

- Au total 60 centres de santé, 60 écoles et 18 Centres nutritionnels ont été identifiés dans les trois provinces de la zone Kasai en raison de 20 Centres de santé et écoles par

Province et 18 centres nutritionnels.

- La validation de tous les sites retenus aura lieu lors des réunions des Comités Provinciaux de Coordination et Suivi au début de l'année prochaine.

1.3. COORDINATION, SUIVI-ÉVALUATION, GESTION DES CONNAISSANCES ET COMMUNICATION

1.3.1. Coordination et gestion

Achat matériels, équipements et réhabilitation bureaux

- Les travaux de réhabilitation du nouveau bâtiment abritant les bureaux de l'UNCP à Kananga sont terminés. Le système photovoltaïque est installé et fonctionnel.
- Toute l'équipe de la coordination nationale est à Kananga depuis le mois de novembre 2024.
- Les matériels informatiques (12 Laptops) sont achetés et remis aux utilisateurs dont l'équipe SAF et le Suivi évaluation.
- Les travaux de rénovation des bureaux des coordinations provinciales de Kindu et Mbuji mayi sont réalisées.
- Le mur de clôture de la coordination de Kindu est construit. .
- Les centrales photos voltaïques sont installées et opérationnelles
- La surveillance des travaux a été assurée par la Division Provinciale des Infrastructures et Travaux Publics.

1.3.2 Suivi de l'évaluation, de la gestion des connaissances et de la communication

Gestion des savoirs

- Le contrat avec PROCASUR est signé pour un accompagnement de proximité en matière de gestion et capitalisation des connaissances pour deux ans soit 2024 et 2025.
- En 2024, PROCASUR a conduit une première mission de diagnostic qui s'est entièrement déroulé dans la zone Kasai. Cette mission avait pour objectif de dresser l'état des lieux de la gestion des savoirs au sein du PADRIR et de ses partenaires opérationnels.
- Sur base des informations recueillies lors du diagnostic associé aux échanges permanent avec l'équipe du projet, le consultant est actuellement entrain de rédiger la stratégie de gestion des savoirs et son plan de mise en œuvre.

- La restitution et la présentation de la stratégie sont prévues au mois de février 2025.

Communication

- Le PADRIR a recruté une consultante en communication après un processus compétitif.
- La consultante a rédigé la stratégie de communication laquelle stratégie a été validée lors d'un atelier ouvert aux experts en communication.
- Concernant la mise en œuvre du plan opérationnel, nous pouvons retenir:
 - ✓ La mission de diagnostic des radios communautaires et sélection des radios pilotes à contractualiser,
 - ✓ Lancement du processus de contractualisation avec les radios communautaires: Les contrats avec les radios communautaires sont élaborés et prêts pour demander l'ANO FIDA.
 - ✓ Le processus de recrutement d'un webmaster pour la création du site internet de PADRIR a été lancé.
 - ✓ A ce jour, un consultant individuel est en voie de contractualisé avec le PADRIR pour la création du site et l'organisation du back office (administration du site web par l'équipe du projet).
 - ✓ Les matériels de visibilité comme les polos, képis, gilets, Roll Up, banderoles,... sont régulièrement produits principalement lors des événements importants. .
 - ✓ Vu que les formations planifiées sur la communication et d'autres activités pertinentes n'ont pas été réalisées, le projet compte solliciter la signature d'un nouveau contrat avec la consultante pour l'opérationnalisation du plan de communication du projet.

suivi évaluation

- ✓ Le manuel de Suivi Évaluation assorti des annexes (fiches de collecte) sont disponibles.
- ✓ Le système de suivi évaluation digitalisée (Prose) est installé.
- ✓ Les administrateurs du SISE du Système (Conseiller Programmation, Suivi Évaluation, Responsable Suivi Évaluation Mbuji mayi, Coordonnateur National, Coordonnateur Provincial de Kindu et Responsable administratif et Financier) sont formés à Kinshasa sur l'utilisation du logiciel.
- ✓ La formation de tous les utilisateurs n'a pas eu lieu à cause de l'expiration du contrat du cabinet ECU-Prose.

- ✓ Une application mobile sera conçue pour faciliter son utilisation même offline.
- ✓ L'étude baseline a été réalisée, les résultats restitués et le rapport est disponible.
- ✓ Ciblage des bénéficiaires. Le ciblage des bénéficiaires a été réalisé dans les deux zones. L'activité a permis d'identifier les bénéficiaires des semences et leurs besoins.
- ✓ Une équipe restreinte du PADRIR composée du Coordonnateur National, Coordonnateur Provincial de Maniema et du Conseiller Programmation et Suivi-Evaluation a pris part à Dakar à une formation le Suivi Évaluation, la collecte des données avec Kobo et l'utilisation du logiciel MS PROJECT.

1.3.1. Assistance technique

- ✓ Le projet a bénéficié d'une Mission d'Assistance Technique conduite par Monsieur Matthieu ENONE qui a appuyé les activités de la composante 1. La restitution de la mission a eu lieu mais le rapport final est attendu.
- ✓ Cette mission a permis au projet d'évaluer les progrès, d'identifier les activités programmées dans le DCP mais non encore mis en œuvre et les stratégies pour évoluer assez rapidement d'ici la mission de revue à mi parcours.
- ✓ Le processus de recrutement d'un consultant environnementaliste est en cours. Les termes de référence sont soumis à la Demande de l'ANO.
- ✓ Le processus de recrutement d'une consultant pour l'archivage électronique des documents est en cours aussi. L'ANO est attendu.

1.3.2. Mise en place cadre de contrôle financier interne

- ✓ Le consultant auditeur interne a été recruté mais il s'est retrouvé en position de conflit d'intérêt étant donné qu'il a un autre contrat avec le projet dans le cadre de l'appui à l'implantation du TOMPRO.
- ✓ Sur demande du projet, le Comité de pilotage a mis fin au contrat de l'auditeur interne. Le recrutement d'un autre auditeur interne sera lancé au T1 2024.
- ✓ L'équipe SAF a suivi une formations dont sur la comptabilité SYCEBNL visant à doter les entités à but non-lucratif comme le PADRIR, d'un cadre comptable spécifique en harmonie avec les pratiques comptables à travers l'espace OHADA.
- ✓ L'équipe SAF et le Coordonnateur National ont pris part à une formation organisée par le FIDA sur la Gestion financière à Brazzaville.

DIFFICULTES

- Conflit de compétence entre services étatiques et cela perturbe la signature des protocoles de collaboration avec les services étatiques.
- Quelques Services Étatiques partenaires n'avaient pas de comptes bancaires. D'où, le projet a utilisé les comptes de transfert des autres services pour faire transiter les fonds.
- A la fin de l'exercice 2024, au moins 90% de services avaient ouvert leurs comptes bancaires.
- La dégradation avancée des routes nationales et des pistes rurales dans la zone du projet. L'accès des équipe du projet dans certains bassins et sous bassins comme Lubutu et Punia dans le Maniema, Lubao dans la Lomami et Luiza dans le Kasai Central est rendu difficile.
- La Banque Fisrt Bank libere les fonds avec des retards compris entre 15 et 30 jours. La coordination provinciale de Mbuji mayi accède aux fonds pour les activités avec un grand retard? C'est le même cas pour les partenaires de mise en œuvre et les consultants. Le projet a sollicité au Ministère des finances l'ouverture du compte des opérations dans d'autres banques.
- Absence des fonds BADEA sans lesquels, le projet risque de ne pas atteindre ses objectifs;

DEFIS MAJEURS

- Accroître le taux de décaissement et le taux d'exécution physique des activités
- Préparer sereinement la Revue à Mi Parcours.
- Stabiliser le personnel cadre du projet pour éviter les recrutements perpétuels.
- Mobiliser les fonds BADEA pour accroître le niveau d'investissement dans les infrastructures

ANNEXES

DESCRIPTION	Date de démarrage du processus	Niveau de mise en œuvre	Commentaires
Marchés des Biens			
Achat des motos pour les STE et UCP Kasai -Maniema	23/02/2024	Marché Annulé	Défaut de procédure
Achat matériels Informatiques UNCP et Services étatiques	01/03/2024	Marché clôturé	Acheté et distribué
Achat et installation micro photovoltaïque Mbuji-Mayi	27/02/2024	Marché clôturé	En cours d'installation
Achat et installation micro photovoltaïque Kindu	07/03/2024	Marché clôturé	Installée
Achat de semence R1 au profit des ménages et OP au Kasai	13/02/2024	Marché clôturé	Évaluation
Achat de semence R1 au profit des ménages et OP au Maniema	13/02/2024	Marché clôturé	
Achat et fourniture de serre à l'INERA Ngandajika	01/02/2024	Marché clôturé	
Recrutement d'une Société de gardiennage des bureaux du PADRIR	12/02/2024	Marché clôturé	
Achat des équipements du laboratoire de SENASEM Maniema	23/09/2024	Marché attribué	Livraison en cours
Achat des équipements de collecte des données SE- UNCP	18/03/2024	Marché clôturé	Matériels disponibles
Achat des matériels/équipements agricoles aux coopératives au Maniema	13/05/2024	Marché clôturé	Matériels distribués aux bénéficiaires
Achat des matériels/équipements agricoles aux coopératives au Kasai	13/05/2024	Marché attribué	
Achat des Kits maraîchers aux associations et OP au Maniema	11/03/2024	Marché clôturé	Matériels distribués aux bénéficiaires
Achat des Kits maraîchers aux associations et OP au Kasai	11/03/2024	Marché attribué	Matériels distribués

Achat semence de Base/Bouture à l'INERA Ngandajika	01/04/2024	Bon de commande déposée à l'INERA	Elaboration du Contrat
Achat matériels et équipement agricole pour INERA Salubezya	25 mars 14h42	Marché clôturé	Matériels distribués
Marchés des Services de conseil			
Reconduction du contrat du cabinet MGI pour l'audit externe des comptes du Programme	04 mars 16h11	Attribué	Prestation clôturée
Recrutement d'un Assistant au Maître d'Ouvrage (AMO) dans la Province du Maniema	08 sept. 16h17	Attente ANO FIDA	Une seule offre reçue
Contractualisation avec le SNVA pour la vulgarisation des Bonnes Pratiques Agricoles	-	ANO Obtenu et protocole signé	Mise en œuvre des activités
Recrutement d'une firme nationale pour réaliser les études techniques de 140 Km des pistes rurales	03/07/2023	Procédure en cours	
Contractualiser avec Inspection Provinciale à l'Agriculture KASAI	06/05/2024	ANO IPA Kasai Central. Kasai Oriental et Lomami	Mise en œuvre des activités
Contractualiser avec Inspection Provinciale à l'Agriculture Maniema	06/05/2024	ANO FIDA	Mise en œuvre en cours
Contractualiser avec Programme National Riz au Maniema	04/03/2024	DNO protocole opérationnel	Protocole cadre soumis
Contractualiser avec Inspection Provinciale de Développement Rurale KASAI	08/03/2024	Protocole annulé	
Contractualiser avec Inspection Provinciale de Développement Rurale Maniema	14/03/2024	Contrat signé	
Contractualiser avec Agence	05/08/2024	Protocole en	Faire le suivi

Congolaise de l'Environnement-Kinshasa		négociation	
Contractualiser avec Inspection Provinciale du Développement Rurale Maniema <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Pour la mise en place des comités de gestion et formation des animateurs des infra des marchés ;</i> ✓ <i>Pour la mise en place des comités de gestion et formation des animateurs des forages.</i> 	15/07/2024	Contrat signé	
Contractualiser avec PRONANUT pour organiser les séances de sensibilisation au Maniema <i>Organiser les séances de sensibilisation des bonnes pratiques nutritionnelles aux ménages du Maniema</i>	21/01/2024	Protocole en attente ANO	
Recruter un consultant Individuel pour les études techniques de construction des écoles au Maniema	14/10/2024	Dossier technique en cours d'élaboration	Soumission à l'ANO
Recruter CI pour les études techniques de construction des centres nutritionnels au Maniema	29/05/2024	Dossier technique en cours d'élaboration	Soumission à l'ANO
Recruter un bureau conseil pour les études techniques et EIES du Dorsale et ouvrages d'art Maniema	19/02/2024	Procédure en cours	Attribuer le marché
Recruter un CI pour les études techniques de construction des centres de santé au Maniema	09/09/2024	Dossier technique en cours	Soumission à l'ANO

		d'élaboration	
<p>Contractualiser avec ONHR Maniema</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>Pour identification des sites potentiels d'aménagement des sources d'eau ;</i> ✓ <i>Pour les études géophysiques des sites potentiels pour les travaux des forages</i> ✓ <i>Recruter un CI pour les études techniques des marchés au Maniema</i> 	05-juin	Protocole posté	
Recruter un bureau conseil pour les études techniques et EIES des pistes rurales au Kasai-Central	20/02/2024	Mémo soumis à l'ANO pour utilisation de la shortliste	Soumettre l'AP à l'ANO
Les études techniques et EIES des pistes rurales au Kasai Central			
Contractualiser avec Office des Routes Maniema	05/08/2024	Protocole opérationnel élaboré et en négociation	Solliciter l'ANO
Pour la validation des études techniques			
Recruter un CI pour l'élaboration de la stratégie d'accompagnement des acteurs et Modules	12/02/2024	Dossier technique non disponible	Soumission à l'ANO
Élaboration de la stratégie d'accompagnement des acteurs et Modules de formation		Protocole de collaboration soumis à la DNO FIDA	Saphir Développement
Une étude d'identification des sites d'implantation des unités de transformation des produits agricoles, des équipements appropriés et des	11/03/2024	Tdrs élaborés et à soumettre à la DNO FIDA	Soumission à l'ANO

potentiels bénéficiaires			
Contractualiser avec PRONANUT pour organiser les séances de sensibilisation des bonnes pratiques		Protocole soumis	Soumission à l'ANO
Recruter une firme pour mener une étude d'analyse des chaînes de valeurs agricoles et cartographie	26/02/2024	Réalisée	Rapport d'étude
Contractualiser avec SENAHUP Maniema	01/03/2024	ANO Accordé le 19 juin	Mise en œuvre des activités
Contractualiser avec SENAHUP KASAI	01/03/2024	ANO Accordé le 19 juin	Signature
Contractualiser avec SENAMA Maniema	15/07/2024	Annulé	Soumission à l'ANO
Contractualiser avec SENAMA KASAI	15/07/2024	Annulé	Soumission à l'ANO
Recruter un CI pour identifier les besoins en équipements et matériels au Maniema	11/03/2024	Elaboration tdrs	Soumission à l'ANO
Contractualiser avec SNVA KASAI	28/08/2024	ANO FIDA	Mise en œuvre
Contractualiser avec SNVA Maniema	28/08/2024	ANO Obtenu	Mise en œuvre
Contractualiser avec SENAFIC Maniema	24/06/2024	Protocole annulé en 2024	Soumission à l'ANO
Contractualiser avec SENAFIC Kasai	02/09/2024	Protocole annulé en 2024	Soumission à l'ANO
Contractualiser avec IPPEL Maniema	04/04/2024	Protocole annulé en 2024	
Contractualiser avec IPPEL Kasai	04/04/2024	Protocole annulé en 2024	Soumission à l'ANO
Contractualiser avec SENADEPA Maniema	01/04/2024	ANO FIDA	Mise en œuvre
Contractualiser avec SENADEPA au KASAI	01/04/2024	ANO FIDA	Mise en œuvre

Recruter un prestataire de transport pour la semence R1 Kasai	03/03/2024	Marché inclus dans l'achat R1	Attribution
Transport des semences de base/Bouture les sites d'exploitation des agri multiplicateurs	22/07/2024	DP élaboré	En attente d'achat semence
Contractualisation avec SENASEM/Zone Maniema pour la formation, suivi des champs et la certification des semences	03/03/2024	ANO Obtenu et protocole signé	Mise en œuvre des activités
Contractualisation avec SENASEM/Zones Kasai et Lomami pour la formation, suivi des champs et la certification des semences	03/03/2024	ANO Obtenu et protocole signé	Mise en œuvre des activités
Marché des Travaux			
Travaux de réfection des bureaux UCP Mbuji-Mayi	12/02/2024	Attribué	En cours de déploiement
Contractualiser avec SENADEPA pour réhabilité 2 stations d'alevinage et une éclosérie au Maniema	29/02/2024	ANO FIDA	Mise en œuvre
Contractualiser avec SENADEPA pour réhabilité 3 stations d'alevinage au Kasai	26/02/2024	ANO FIDA	Mise en œuvre
Réhabiliter le laboratoire Provincial de SENASEM Maniema	17/06/2024	ANO Obtenu et protocole signé	Mise en œuvre des activités
Travaux de construction du mur de clôture UCP-Kindu	15/02/2024	Marché attribué	Crédit insuffisant
Travaux de réfection bureau UNCP-Kananga	20/02/2024	Marché attribué	Signature contrat
Travaux de construction de 3 centres Nutritionnels au Maniema	25/03/2024	Dossier technique en cours d'élaboration	Soumission à l'ANO
Travaux de construction et équipement de 4 écoles au Maniema	08/04/2024	Dossier technique en	Soumission à l'ANO

		cours d'élaboration	
Travaux de construction et équipement de 4 centres de santé au Maniema	25/03/2024	Dossier technique en cours d'élaboration	Soumission à l'ANO
Travaux d'aménagement des sources d'eau au Maniema	01/04/2024	Dossier technique en cours d'élaboration	Publication
Travaux de construction des forages dans le Maniema	01/04/2024	Dossier technique en cours d'élaboration	Soumission à l'ANO
Travaux de construction des Marchés et Infrastructures connexes au Maniema	15/04/2024	Dossier technique en cours d'élaboration	Soumission à l'ANO



**IMAGES DE
QUELQUES**

REALISATIONS

Nouveau bureau de la Coordination Nationale à Kananga

Bénéficiaires des semences R1

Champs semenciers de riz dans la Province de Maniema



Champ de Niébé dans la zone Kasai



Etang piscicole dans la Province de Maniema

